


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL  
LARANJEIRAS DO SUL/PR  
CENTRO ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.752,39	1,67%	100,00%	R\$ 10.752,39	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 50.733,99	7,89%	16,67%	R\$ 8.457,36	16,67%	R\$ 8.457,36	16,66%	R\$ 8.452,28	16,66%	R\$ 8.452,28	16,67%	R\$ 8.457,36	16,67%	R\$ 8.457,36
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 9.455,35	1,47%	100,00%	R\$ 9.455,35	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	R\$ 51.097,88	7,95%	-	-	25,00%	R\$ 12.774,47	25,00%	R\$ 12.774,47	50,00%	R\$ 25.548,94	-	-	0,00%	-
5	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 7.068,88	1,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 3.534,44	50,00%	R\$ 3.534,44
6	QUADRA DE AREIA	R\$ 56.672,36	8,82%	-	-	25,00%	R\$ 14.168,09	25,00%	R\$ 14.168,09	25,00%	R\$ 14.168,09	25,00%	R\$ 14.168,09	0,00%	-
7	PERGOLADO	R\$ 18.305,50	2,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 9.152,75	50,00%	R\$ 9.152,75
8	PLAYGROUND	R\$ 13.527,21	2,10%	-	-	-	-	-	-	33,00%	R\$ 4.463,98	33,00%	R\$ 4.463,98	34,00%	R\$ 4.599,25
9	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 126.351,42	19,66%	-	-	-	-	25,00%	R\$ 31.587,86	25,00%	R\$ 31.587,86	25,00%	R\$ 31.587,86	25,00%	R\$ 31.587,86
10	SUPERESTRUTURA	R\$ 24.227,26	3,77%	50,00%	R\$ 12.113,63	50,00%	R\$ 12.113,63	3,77%	-	-	-	-	-	0,00%	-
11	ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	R\$ 6.958,63	1,08%	-	-	50,00%	R\$ 3.479,32	50,00%	R\$ 3.479,32	-	-	-	-	0,00%	-
12	COBERTURA	R\$ 24.375,57	3,79%	-	-	-	-	50,00%	R\$ 12.187,79	50,00%	R\$ 12.187,79	-	-	0,00%	-
13	REVESTIMENTOS	R\$ 29.070,09	4,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 14.535,05	50,00%	R\$ 14.535,05
14	ESQUADRIAS	R\$ 10.729,07	1,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 10.729,07	0,00%	-
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 23.262,54	3,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 23.262,54	0,00%	-
16	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 3.087,90	0,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 3.087,90
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 34.882,23	5,43%	-	-	-	-	25,00%	R\$ 8.720,56	25,00%	R\$ 8.720,56	50,00%	R\$ 17.441,12	0,00%	-
18	BIOVALETAS	R\$ 7.172,75	1,12%	-	-	50,00%	R\$ 3.586,38	50,00%	R\$ 3.586,38	-	-	-	-	0,00%	-
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 126.359,40	19,66%	-	-	-	-	-	-	25,00%	R\$ 31.589,85	25,00%	R\$ 31.589,85	50,00%	R\$ 63.179,70
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.676,12	1,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 8.676,12
TOTAL GERAL		R\$ 642.766,54	100,00%	6,34%	R\$ 40.778,73	8,49%	R\$ 54.579,24	14,77%	R\$ 94.956,73	21,27%	R\$ 136.719,34	26,28%	R\$ 168.922,09	22,84%	R\$ 146.810,42
TOTAIS ACUMULADOS				6,34%	R\$ 40.778,73	14,84%	R\$ 95.357,96	29,61%	R\$ 190.314,69	50,88%	R\$ 327.034,03	77,16%	R\$ 495.956,12	100,00%	R\$ 642.766,54

Última atualização em 19/11/2025 às 10:54:29

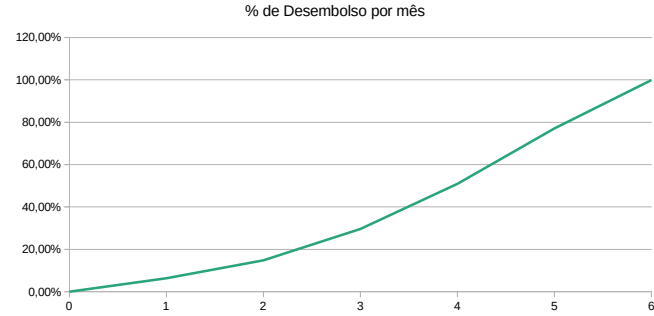



***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº 14/2025 - DAADM (10.55.01)***

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 21/11/2025 08:37 )*

**CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER**

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###168#4

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **14**  
, ano: **2025**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **20/11/2025** e o código de  
verificação: **b4adf15df9**
